| | Режим Нагруз | Название задачи | Продолжительность | Начало | Окончание | Предыдущие | Участники | Ответственный | % Complet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Запуск ППО ЦСР ФИАС на КОЭ и КПЭ** | **100 день?** | **Wed 15.01.25 09:00** | **Tue 03.06.25 18:00** | | | | **0%** |
| 2 | | **Подготовительные работы в части разработки/доработки LLM моделей и ППО ЦСР ФИАС** | **109 день** | **Mon 22.06.26 09:00** | **Fri 20.11.26 18:00** | | | | **6%** |
| 3 | | Разработать промпты на критерии и тестового датасета | 51 день | Mon 22.06.26 09:00 | Mon 31.08.26 18:00 | | ГНИВЦ Команда прикладной сист | | 10% |
| 4 | | Разработать редактируемый справочник критериев для совместного заполнения инспекциями и ГНИВЦ (критерий, промпт, условия применимости, набор тестовых документов положит. И отриц.) | 46 день | Mon 29.06.26 09:00 | Mon 31.08.26 18:00 | 3 | ГНИВЦ Команда прикладной системы | | 11% |
| 5 | | Разработать механизм исполнения сценариев включая тестовое исполнение с оценкой качества ответов | 41 день | Mon 06.07.26 09:00 | Mon 31.08.26 18:00 | 4 | ГНИВЦ Команда ИИ | | 10% |
| 6 | | Провести тестирование моделей, выбор моделей | 5 день | Tue 01.09.26 09:00 | Mon 07.09.26 18:00 | 5 | ГНИВЦ Команда ИИ | | 0% |
| 7 | | Настроить интеграцию с OCR для обеспечения распознования документов | 5 день | Tue 08.09.26 09:00 | Mon 14.09.26 18:00 | 6 | ГНИВЦ Команда прикладной системы | | 0% |
| 8 | | Доработать ЦСР/ФИАС | 25 день | Tue 15.09.26 09:00 | Mon 19.10.26 18:00 | 7 | ГНИВЦ Команда прикладной сист | | 0% |
| 9 | | Сформировать отчеты по проверкам для ИИ моделей | 7 день | Tue 08.09.26 09:00 | Wed 16.09.26 18:00 | 6 | ГНИВЦ Команда ИИ | | 0% |
| 10 | | **Провести тестирование на ADP ГНИВЦ решения ЦСР ФИАС и моделей LLM** | 5 день | Tue 20.10.26 09:00 | Mon 26.10.26 18:00 | 8 | ГНИВЦ Команда ИИ | | 0% |
| 11 | | Доработки по итогам тестирования | 7 день | Tue 27.10.26 09:00 | Thu 05.11.26 18:00 | 10 | ГНИВЦ Команда ИИ | | 0% |
| 12 | | Подготовить инструкцию по установке и настройке LLM моделей и решения на сервер с GPU | 7 день | Tue 27.10.26 09:00 | Thu 05.11.26 18:00 | 10 | ГНИВЦ | | 0% |
| 13 | | Записать LLM решения на диск | 3 день | Thu 17.09.26 09:00 | Mon 21.09.26 18:00 | 9 | ГНИВЦ Команда ИИ | | 0% |
| 14 | | Подготовить и отправить письмо "О согласовании установки LLM моделей с диска" в УИБ (копия УИТ/ФКУ) с приложением отчета | 1 день | Tue 22.09.26 09:00 | Tue 22.09.26 18:00 | 13 | ГНИВЦ | | 0% |
| 15 | | Получить ответ на письмо от УИБ "О согласовании установки LLM моделей с диска" | 5 день | Wed 23.09.26 09:00 | Tue 29.09.26 18:00 | 14 | УИБ | | 0% |
| 16 | | Передать диск с LLM моделями и решением на проверку ИБ ФКУ с приложением акта приема-передачи | 1 день | Wed 30.09.26 09:00 | Wed 30.09.26 18:00 | 15 | ГНИВЦ Команда ИИ | | 0% |
| 17 | | Провести проверку диска ИБ ФКУ | 3 день | Thu 01.10.26 09:00 | Mon 05.10.26 18:00 | 16 | ФКУ | | 0% |
| 18 | | Согласовать инструкцию с ФКУ по заявке в TFS (заявка по МПИД) | 5 день | Fri 06.11.26 09:00 | Thu 12.11.26 18:00 | 12 | ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ УИТИ | | 0% |
| 19 | | Подготовить документы для передачи ППО ЦСР ФИАС в ФАП | 3 день | Fri 13.11.26 09:00 | Tue 17.11.26 18:00 | 12,13,1 | ГНИВЦ | | 0% |
| 20 | | Передать ППО ЦСР ФИАС в ФАП | 2 день | Wed 18.11.26 09:00 | Thu 19.11.26 18:00 | 19 | ГНИВЦ | | 0% |
| 21 | | Готовность установки ЦСР ФИАС на КОЭ | 1 день | Fri 20.11.26 09:00 | Fri 20.11.26 18:00 | 20 | | | 0% |
| 22 | | **Разработка и согласование МПИД и установка LLM моделей и ППО ЦСР ФИАС на КОЭ** | **141 день?** | **Mon 22.06.26 09:00** | **Thu 14.01.27 18:00** | | | | **0%** |
| 23 | | Перевоз сервера с GPU на Походный с сопутствующими организационными мероприятиями | 26 день? | Mon 13.07.26 09:00 | Mon 17.08.26 18:00 | | ГНИВЦ УИТИ | | 0% |
| 24 | | Разработка и согласование L2 | 26 день | Mon 13.07.26 09:00 | Mon 17.08.26 18:00 | | ГНИВЦ УИТИ | | 0% |
| 25 | | Коммутация по L2 | 5 день | Tue 18.08.26 09:00 | Mon 24.08.26 18:00 | 24 | ФКУ | | 0% |
| 26 | | Инициировать проект в TFS и согласовать его с ФКУ | 5 день | Mon 22.06.26 09:00 | Fri 26.06.26 18:00 | | ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ УИТИ | | 0% |
| 27 | | Актуализировать требованя к ИТ инфраструктуре и согласовать | 7 день | Mon 22.06.26 09:00 | Tue 30.06.26 18:00 | 26SS | ГНИВЦ УИТИ | | 0% |
| 28 | | Отправить письмо в УИТ для согласования выделения дополнительных серверов | 1 день | Wed 01.07.26 09:00 | Wed 01.07.26 18:00 | 27 | ГНИВЦ | | 0% |
| 29 | | Получить ответ от ФКУ о подтверждении наличия оборудования | 5 день | Thu 02.07.26 09:00 | Wed 08.07.26 18:00 | 28 | ФКУ | | 0% |
| 30 | | Получить ответ от УИТ о согласовании выделения оборудования | 5 день | Thu 09.07.26 09:00 | Wed 15.07.26 18:00 | 29 | УИТ | | 0% |
| 31 | | Подготовить МПИД (пояснительную записку, матрицу сетевого взаимодействия, схему развертывания ЦСР ФИАС (с GPU)) | 20 день | Wed 01.07.26 09:00 | Tue 28.07.26 18:00 | 27 | ГНИВЦ УИТИ | | 0% |
| 32 | | Согласовать с ФКУ в tfs по заявке (ПЗ, схемы, матрицы сетевого взаимодействия (использование GPU СКУАД), профиль трафика) | 20 день | Mon 20.07.26 09:00 | Fri 14.08.26 18:00 | 31FS-7 день | ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ УИТИ | | 0% |
| 33 | | Направить письмо в УИТ (УИБ, ФКУ) об утверждении комплекта документации (ПЗ, схемы, матрицы сетевого взаимодействия (использование GPU СКУАД), профиль трафика) | 1 день | Mon 17.08.26 09:00 | Mon 17.08.26 18:00 | 32 | ГНИВЦ УИТИ | | 0% |
| 34 | | Получить ответ от УИТ об утверждении комплекта документации (ПЗ, схемы, матрицы сетевого взаимодействия (использование GPU СКУАД), профиль трафика) | 5 день | Tue 18.08.26 09:00 | Mon 24.08.26 18:00 | 33 | УИТ | | 0% |
| 35 | | Сформировать заявку на создание VLAN для ЦСР ФИАС | 1 день | Mon 17.08.26 09:00 | Mon 17.08.26 18:00 | 33FF | ГНИВЦ | | 0% |
| 36 | | Создать VLAN в rDMZ Москва | 3 день | Tue 25.08.26 09:00 | Thu 27.08.26 18:00 | 34,35,2 | ФКУ | | 0% |
| 37 | | Сформировать заявку на создание СВ для LLM по МПИД | 1 день | Mon 17.08.26 09:00 | Mon 17.08.26 18:00 | 33FF | ГНИВЦ УИТИ | | 0% |
| 38 | | Создать СВ  для LLM по заявке в TFS | 5 день | Fri 28.08.26 09:00 | Thu 03.09.26 18:00 | 36,37 | ФКУ | | 0% |
| 39 | | Сформировать заявку на установку (обновление) ЦСР ФИАС | 1 день | Mon 23.11.26 09:00 | Mon 23.11.26 18:00 | 21 | ГНИВЦ Команда прикладной сист | | 0% |
| 40 | | Установить (обновление) ЦСР ФИАС по заявке TFS | 15 день | Tue 24.11.26 09:00 | Mon 14.12.26 18:00 | 39,38 | ФКУ | | 0% |
| 41 | | Установить LLM моделей и решения по инструкции силами ГНИВЦ (в т.ч. Командировка сотрудника ГНИВЦ) (централизовано со СКУАД) | 14 день | Mon 23.11.26 09:00 | Thu 10.12.26 18:00 | 17,21 | ГНИВЦ Команда ИИ | | 0% |
| 42 | | **Провести тестирование решения с LLM силами ГНИВЦ** | 5 день | Tue 15.12.26 09:00 | Mon 21.12.26 18:00 | 40,41 | ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр | | 0% |
| 43 | | Корректировки по итогам тестирования | 10 день | Tue 22.12.26 09:00 | Wed 13.01.27 18:00 | 42 | ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр | | 0% |
| 44 | | **Провести демонстрацию заказчику на КОЭ** | 1 день | Thu 14.01.27 09:00 | Thu 14.01.27 18:00 | 42,43 | ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр | | 0% |
| 45 | | Согласование с УИБ и перенос промышленных данных на КОЭ для реализации КПЭ | 20 день | Mon 02.11.26 09:00 | Mon 30.11.26 18:00 | | ГНИВЦ Команда ИИ и команда прикладной системы | | 0% |
| 46 | | Тестирование на промышленных данных силами ГНИВЦ | 5 день | Tue 01.12.26 09:00 | Mon 07.12.26 18:00 | 45 | ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр | | 0% |
| 47 | | **Провести демонстрацию заказчику на КОЭ с промышленными данными для реализации КПЭ** | 1 день | Tue 08.12.26 09:00 | Tue 08.12.26 18:00 | 46 | ГНИВЦ Команда ИИ и команда прикладной системы | | 0% |
| 48 | | **Подготовительные работы** | **264 день?** | **Mon 13.07.26 09:00** | **Tue 03.08.27 18:00** | | | | **0%** |
| 49 | | Поставка оборудования для КПЭ | 1 день? | Wed 30.12.26 09:00 | Thu 31.12.26 18:00 | | | | 0% |
| 50 | | Доработать LLM модели и ППО ЦСР ФИАС после проведения демонстрации заказчику на КОЭ | 15 день | Fri 15.01.27 09:00 | Thu 04.02.27 18:00 | 44 | ГНИВЦ Команда ИИ | | 0% |
| 51 | | Доработать инструкции по развертыванию LLM моделей и документации ППО ЦСР ФИАС | 10 день | Fri 05.02.27 09:00 | Thu 18.02.27 18:00 | 50 | ГНИВЦ Команда ИИ | | 0% |
| 52 | | Согласование проноса диска с LLM моделями на КПЭ | 80 день? | Mon 13.07.26 09:00 | Fri 30.10.26 18:00 | | УИБ,ФКУ,ГНИВЦ | | 0% |
| 53 | | Согласовать инструкции по развертыванию LLM моделей с ФКУ | 15 день | Fri 19.02.27 09:00 | Tue 16.03.27 18:00 | 51 | ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ Команда ИИ | | 0% |
| 54 | | Сформировать отчеты по проверкам для ИИ моделей | 10 день | Fri 05.02.27 09:00 | Thu 18.02.27 18:00 | 41,50 | ГНИВЦ Команда ИИ | | 0% |
| 55 | | Записать LLM модели на диск | 3 день | Fri 19.02.27 09:00 | Thu 25.02.27 18:00 | 54 | ГНИВЦ Команда ИИ | | 0% |
| 56 | | Подготовить и отправить письмо "О согласовании установки LLM моделей с диска" в УИБ (копия УИТ/ФКУ) с приложением отчета | 1 день | Fri 26.02.27 09:00 | Fri 26.02.27 18:00 | 52,55 | ГНИВЦ | | 0% |
| 57 | | Получить ответ на письмо от УИБ "О согласовании установки LLM моделей с диска" | 5 день | Mon 01.03.27 09:00 | Fri 05.03.27 18:00 | 56 | ГНИВЦ,УИБ | | 0% |

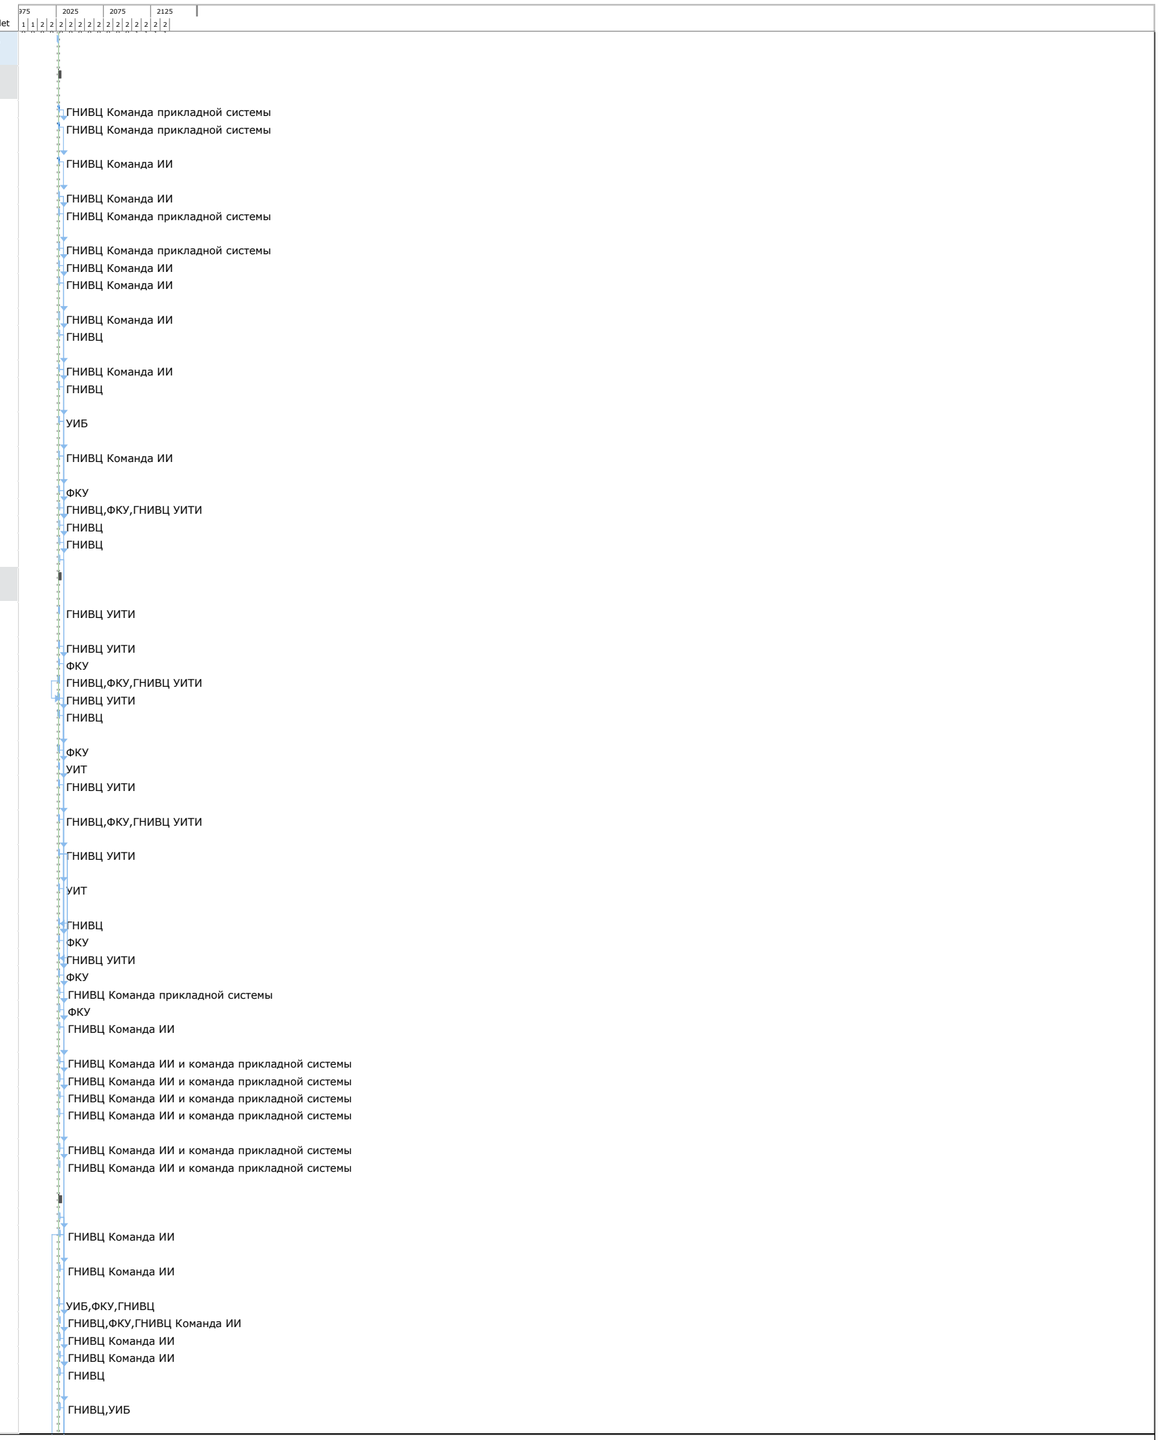


Задача | Веха | Суммарная задача проекта | Неактивная веха | Задача вручную | Суммарное сведение вручную | Только начало | Внешние задачи | Крайний срок | Выполнение задач, запланированных вручную
Прерывание | Суммарная задача | Неактивная задача | Неактивная суммарная задача | Только длительность | Суммарная задача вручную | Только окончание | Внешняя веха | Ход выполнения

| | Режим Нагруз | Название задачи | Продолжительность | Начало | Окончание | Предыдущие | Участники | Ответственный | % Complet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | | Передать диск с LLM моделями на проверку ИБ ФКУ с приложением акта приема-передачи | 1 день | Tue 09.03.27 09:00 | Tue 09.03.27 18:00 | 57 | ГНИВЦ Команда ИИ | | 0% |
| 59 | | Провести проверку диска ИБ ФКУ | 3 день | Wed 10.03.27 09:00 | Fri 12.03.27 18:00 | 58,52 | ФКУ | | 0% |
| 60 | | Принять решение о способе доступа к диску для настройки LLM моделей | 15 день | Fri 15.01.27 09:00 | Thu 04.02.27 18:00 | 50SS,49 | ГНИВЦ Команда ИИ | | 0% |
| 61 | | *Отправить письмо о согласовании трансфера* | *2 день* | *Fri 05.02.27 09:00* | *Mon 08.02.27 18:00* | *60,49* | *ГНИВЦ УИТИ* | | *0%* |
| 62 | | *Трансфер GPU-сервера из Городца в Дубну* | *12 день* | *Tue 09.02.27 09:00* | *Fri 26.02.27 18:00* | *61,49* | *ГНИВЦ УИТИ* | | *0%* |
| 63 | | Подготовить документы для передачи ППО ЦСР ФИАС в ФАП | 5 день | Mon 15.03.27 09:00 | Fri 19.03.27 18:00 | 59 | ГНИВЦ Команда прикладной сист | | 0% |
| 64 | | Передать ППО ЦСР ФИАС в ФАП | 2 день | Mon 22.03.27 09:00 | Tue 23.03.27 18:00 | 63 | ГНИВЦ Команда прикладной сист | | 0% |
| 65 | | Сервера GPU поставлены на КПЭ | 1 день | Wed 24.03.27 09:00 | Wed 24.03.27 18:00 | 64,60,6 | | | 0% |
| 66 | | Сформировать схему L2 | 10 день | Mon 01.03.27 09:00 | Mon 15.03.27 18:00 | 62 | ГНИВЦ УИТИ | | 0% |
| 67 | | Согласовать схему L2 в рабочем порядке с ФКУ в Lotus | 15 день | Tue 16.03.27 09:00 | Mon 05.04.27 18:00 | 66 | ФКУ | | 0% |
| 68 | | Сформировать требования к серверу и разместить в РСИС на согласование на сервер с GPU | 7 день | Tue 16.03.27 09:00 | Wed 24.03.27 18:00 | 66 | ГНИВЦ УИТИ | | 0% |
| 69 | | Согласовать требования к серверу GPU в РСИС | 15 день | Thu 25.03.27 09:00 | Wed 14.04.27 18:00 | 68 | ФКУ | | 0% |
| 70 | | Направить в УИТ (копия УИБ, ФКУ) о согласовании схемы L2+ требование в РСИС | 1 день | Thu 15.04.27 09:00 | Thu 15.04.27 18:00 | 69 | ГНИВЦ УИТИ | | 0% |
| 71 | | Получить ответ от УИТ о согласовании коммутации серверов + выделения серверов по требованию в РСИС | 5 день | Fri 16.04.27 09:00 | Thu 22.04.27 18:00 | 70 | | | 0% |
| 72 | | Провести выделение и коммутацию серверов | 10 день | Fri 23.04.27 09:00 | Fri 07.05.27 18:00 | 71 | ФКУ | | 0% |
| 73 | | **Разработка и согласование МПИД и установка LLM моделей и ППО ЦСР ФИАС на КПЭ** | **165 день** | **Mon 30.11.26 09:00** | **Tue 03.08.27 18:00** | | | | **0%** |
| 74 | | Инициировать проект в TFS и согласование с ФКУ | 5 день | Mon 11.01.27 09:00 | Fri 15.01.27 18:00 | 49 | ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ УИТИ | | 0% |
| 75 | | Подготовить МПИД (пояснительная записка, матрица сетевого взаимодействия, схема развертывания ЦСР ФИАС (с GPU), L3) | 20 день | Thu 25.03.27 09:00 | Wed 21.04.27 18:00 | 68 | ГНИВЦ УИТИ | | 0% |
| 76 | | Согласование с ФКУ в tfs по заявке ПЗ, схемы, матрицы сетевого взаимодействия (использование GPU СКУАД), профиль трафика, L3) | 25 день | Tue 13.04.27 09:00 | Wed 19.05.27 18:00 | 75FS-7 день | ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ УИТИ | | 0% |
| 77 | | Направить письмо в УИТ (УИБ, ФКУ) об утверждении комплекта документации (ПЗ, схемы, матрицы сетевого взаимодействия (использование GPU СКУАД), профиль трафика, L3) | 1 день | Thu 20.05.27 09:00 | Thu 20.05.27 18:00 | 76 | ГНИВЦ УИТИ | | 0% |
| 78 | | Получить ответное письмо УИТ об утверждении комплекта документации (ПЗ, схемы, матрицы сетевого взаимодействия (использование GPU СКУАД), профиль трафика, L3) | 5 день | Fri 21.05.27 09:00 | Thu 27.05.27 18:00 | 77 | УИТ | | 0% |
| 79 | | Сформировать заявку на создание VLAN для ЦСР ФИАС / сервера с GPU | 1 день | Thu 20.05.27 09:00 | Thu 20.05.27 18:00 | 77FF | ГНИВЦ | | 0% |
| 80 | | Создать VLAN в rDMZ Дубна | 5 день | Fri 28.05.27 09:00 | Thu 03.06.27 18:00 | 78,79 | ФКУ | | 0% |
| 81 | | Сформировать заявку на создание СВ по МПИД | 1 день | Thu 20.05.27 09:00 | Thu 20.05.27 18:00 | 77FF | ГНИВЦ УИТИ | | 0% |
| 82 | | Создать СВ по заявке в TFS | 7 день | Fri 04.06.27 09:00 | Mon 14.06.27 18:00 | 80,81 | ФКУ | | 0% |
| 83 | | Сформировать заявку на установку ЦСР ФИАС | 1 день | Mon 30.11.26 09:00 | Mon 30.11.26 18:00 | | ГНИВЦ Команда прикладной сист | | 0% |
| 84 | | Установить ЦСР ФИАС по заявке TFS | 15 день | Tue 15.06.27 09:00 | Mon 05.07.27 18:00 | 82,83 | ФКУ | | 0% |
| 85 | | Установить LLM моделей по инструкции | 15 день | Thu 10.12.26 09:00 | Wed 30.12.26 18:00 | | ФКУ | | 0% |
| 86 | | Провести тестирование силами ГНИВЦ/ФКУ | 5 день | Tue 06.07.27 09:00 | Mon 12.07.27 18:00 | 84,85 | ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр | | 0% |
| 87 | | Корректировки по итогам тестирования | 15 день | Tue 13.07.27 09:00 | Mon 02.08.27 18:00 | 86 | | | 0% |
| 88 | | **Провести демонстрацию заказчику на КОЭ** | 1 день | Tue 03.08.27 09:00 | Tue 03.08.27 18:00 | 87 | ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр | | 0% |

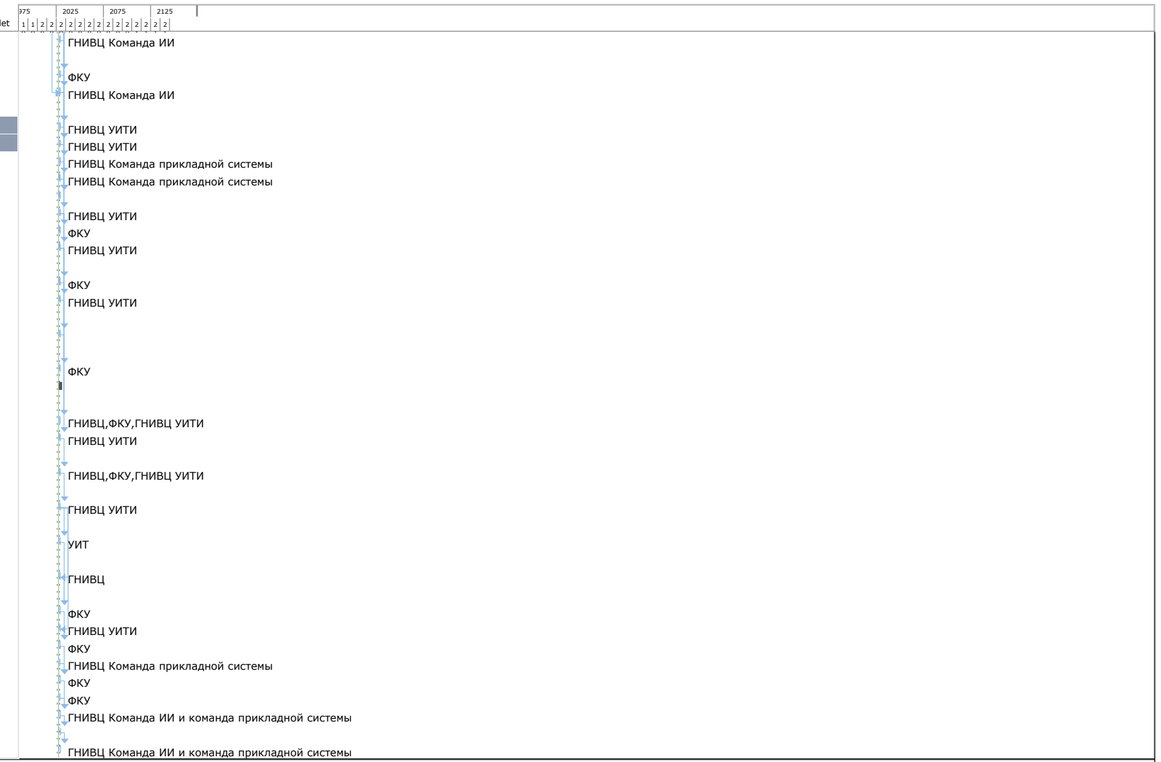


Задача | Веха | Суммарная задача проекта | Неактивная веха | Задача вручную | Суммарное сведение вручную | Только начало | Внешние задачи | Крайний срок | Выполнение задач, запланированных вручную
Прерывание | Суммарная задача | Неактивная задача | Неактивная суммарная задача | Только длительность | Суммарная задача вручную | Только окончание | Внешняя веха | Ход выполнения

Задача
Веха
Суммарная задача проекта
Неактивная веха
Задача вручную
Суммарное сведение вручную
Только начало
Внешние задачи
Крайний срок
Выполнение задач, запланированные вручную
Прерывание
Суммарная задача
Неактивная задача
Неактивная суммарная задача
Только длительность
Суммарная задача вручную
Только окончание
Внешняя веха
Ход выполнения
